

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน  
อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान  
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศการผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอรายงานผลการติดตาม ฯ ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และสภาท้องถิ่นทราบแล้ว ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ อาศัยอำนาจดังกล่าวข้างต้น จึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มาให้ทราบโดยทั่วกัน (ตามเอกสารแนบท้าย) และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ [www.kokwan.go.th](http://www.kokwan.go.th) ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายจักรพงษ์ หงษ์วิเศษ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान

## คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙,๓๐ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ผู้บริหารทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตาม ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน

## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ ๑</b> บทนำ	๑
<b>ส่วนที่ ๒</b> วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	๕
<b>ส่วนที่ ๓</b> การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น	๖
การกำกับการจัดทำแผนพัฒนา	๖
การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	
- ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนโครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๗
- ตารางที่ ๒ จำนวนโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๘
- ตารางที่ ๓ สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑๐
- ตารางที่ ๔ ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๑๓
- ตารางที่ ๕ สรุปผลความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๓	๓๓
- แผนภูมิ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕	๓๔
- ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	๓๔
- แบบประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๖

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด” แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

#### **ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

๑) ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะช่วยให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามีมาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

### ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ดังนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ


กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

**ขั้นตอนที่ ๒** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

**ขั้นตอนที่ ๓** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)

**ขั้นตอนที่ ๔** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

**ขั้นตอนที่ ๕** ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕)

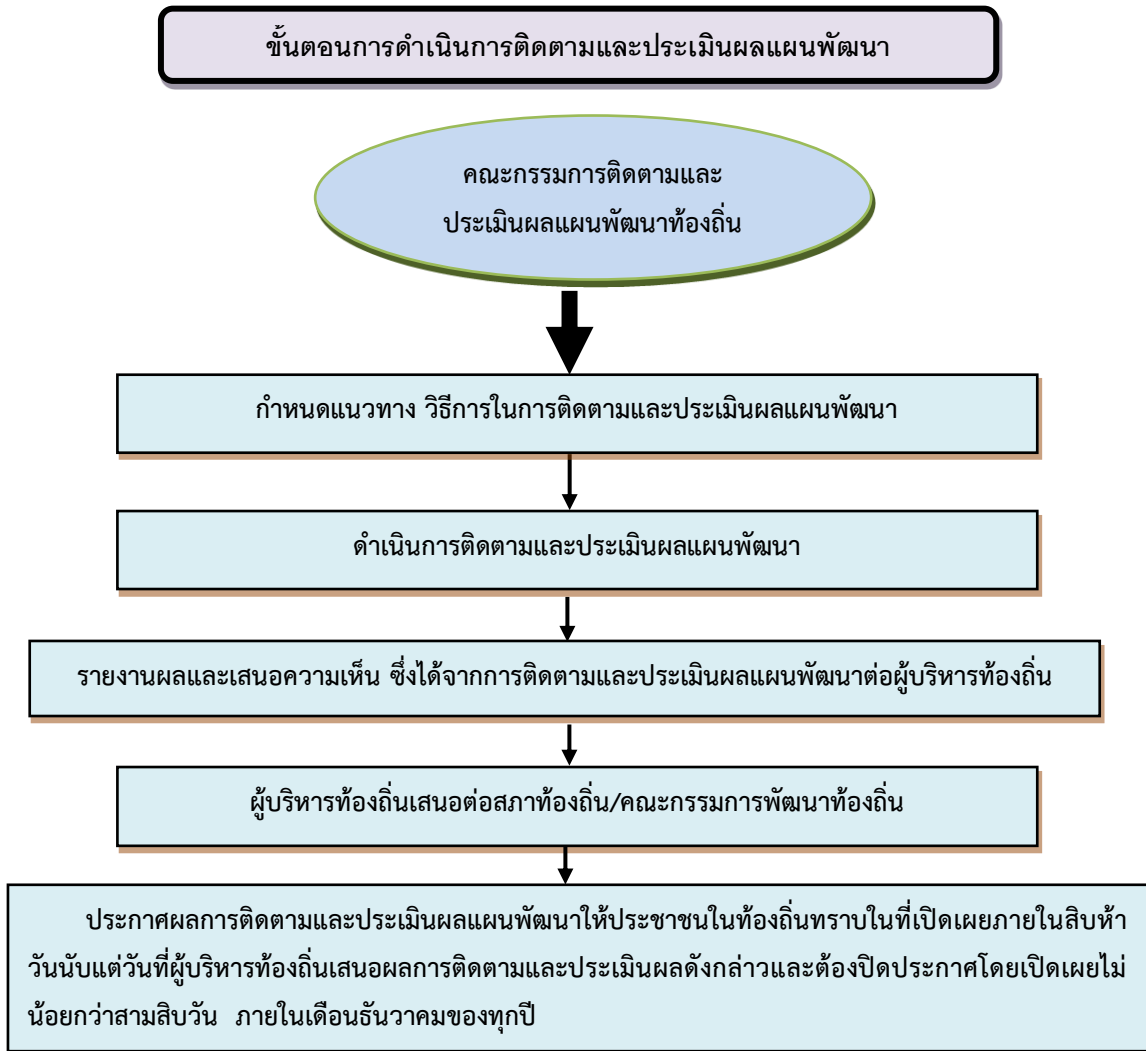

#### กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)



## ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

### วิสัยทัศน์

**“สังคมเกษตรอินทรีย์ พัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาอย่างยั่งยืน”**

### ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
  ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีเป้าประสงค์
๑. พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ โดยได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน และเศรษฐกิจชุมชน
  ๒. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  ๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตและการให้ความคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึง
  ๔. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและทันสมัย
  ๕. พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการอันพึงปรารถนา ร่วมกันอย่างยั่งยืน **ตัวชี้วัด**
๑. บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภคมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
  ๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
  ๓. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการให้ความคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึง
  ๔. จำนวนกิจกรรม/โครงการที่มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  ๕. จำนวนกิจกรรม/โครงการที่มีการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแบบบูรณาการอันพึงปรารถนา ร่วมกันอย่างยั่งยืนค่าเป้าหมาย
๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็งโดยได้รับการบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
  ๒. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง
  ๓. สร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาตามศักยภาพอย่างเต็มที่ และได้รับการบริการต่างๆ ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึง
  ๔. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
  ๕. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะ พัฒนาให้ท้องถิ่นมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนา

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดำเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ โดยรวบรวมข้อมูลแต่ละกองสรุปได้ดังนี้

**แบบที่ ๑** การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่ยังคงประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

**แบบที่ ๒** แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕)

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

**ตารางที่ ๑** จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑.การพัฒนา ทางด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๑๐๘	๙๘,๘๓๐,๐๐๐	๑๐๘	๑๐๕,๐๒๙,๐๐๐	๑๐๘	๑๑๗,๙๒๓,๐๐๐	๑๐๘	๑๑๗,๙๒๓,๐๐๐	๑๐๘	๑๒๔,๖๑๐,๐๐๐
๒.การพัฒนา ทางการเกษตร	๑๒	๗๘๐,๐๐๐	๑๒	๘๕๙,๐๐๐	๑๒	๙๒๑,๐๐๐	๑๒	๙๘๓,๐๐๐	๑๒	๑,๐๕๐,๐๐๐
๓.การพัฒนา ด้านสังคมและคุณภาพ ชีวิต	๕๑	๒๑,๘๗๐,๐๐๐	๕๑	๒๒,๖๑๔,๐๐๐	๕๑	๒๒,๓๕๙,๐๐๐	๕๑	๒๔,๕๘๐,๐๐๐	๕๑	๒๔,๕๘๐,๐๐๐
๔.การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๒๒	๖๕,๗๗๐,๐๐๐	๒๒	๖๕,๘๘๐,๐๐๐	๒๒	๖๖,๐๐๐,๐๐๐	๒๒	๖๖,๒๒๐,๐๐๐	๒๒	๖๖,๓๔๐,๐๐๐
๕.ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๑๕	๔,๑๓๐,๐๐๐	๑๕	๔,๖๕๐,๐๐๐	๑๕	๕,๐๖๕,๐๐๐	๑๕	๕,๖๒๕,๐๐๐	๑๕	๖,๖๙๕,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๒๐๘</b>	<b>๑๙๐,๖๐๐,๐๐๐</b>	<b>๒๐๘</b>	<b>๑๙๘,๑๗๓,๐๐๐</b>	<b>๒๐๘</b>	<b>๒๐๔,๙๙๕,๐๐๐</b>	<b>๒๐๘</b>	<b>๒๑๒,๖๖๖,๐๐๐</b>	<b>๒๐๘</b>	<b>๒๒๒,๒๒๕,๐๐๐</b>

**ตารางที่ ๒** จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ (%) ของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ (%) ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
<b>๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๑	๓๔.๘๘	๔,๖๕๙,๐๐๐	๑๐.๒๖	กองช่าง
<b>รวม</b>	<b>๑๑</b>	<b>๓๔.๘๘</b>	<b>๔,๖๕๙,๐๐๐</b>	<b>๑๐.๒๖</b>	
<b>๒. การพัฒนาทางการเกษตร</b>					
๒.๑ แผนงานการเกษตร	๒	๔.๖๕	๔๐,๐๐๐	๐.๐๘	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๒</b>	<b>๔.๖๕</b>	<b>๔๐,๐๐๐</b>	<b>๐.๐๘</b>	
<b>๓. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต</b>					
๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๒.๓๕	๑๐๐,๐๐๐	๐.๒๒	สำนักปลัด
๓.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๖.๙๗	๙๐,๐๐๐	๐.๑๙	สำนักปลัด
๓.๓ แผนงานสาธารณสุข	๑	๔.๖๕	๑๒๐,๐๐๐	๐.๒๖	สำนักปลัด

**ตารางที่ ๒** จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ (%) ของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ (%) ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓.๔ แผนงานการศึกษา	๒	๔.๖๕	๒,๕๑๔,๔๒๐	๕.๕๔	กองการศึกษา
๓.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๔	๙.๓๐	๒๓๕,๐๐๐	๐.๕๑	กองการศึกษา
๓.๗ แผนงานงบบกลาง	๔	๙.๓๐	๑๔,๓๔๖,๔๐๐	๓๑.๖๑	กองสวัสดิการ ๖
<b>รวม</b>	<b>๑๔</b>	<b>๓๙.๕๗</b>	<b>๑๗,๖๐๘,๘๒๐</b>	<b>๓๘.๗๗</b>	
<b>๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>					
๔.๑ แผนงานการเกษตร	๒	๒.๓๕	๒๐,๐๐๐	๐.๐๔	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๒</b>	<b>๒.๓๕</b>	<b>๒๐,๐๐๐</b>	<b>๐.๐๔</b>	
<b>๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b>					
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๙.๓๐	๗๓๐,๐๐๐	๑.๖๐	สำนักปลัด
๕.๓ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๙.๓๐	๘๐๑,๐๐๐	๑.๗๖	กองช่าง
<b>รวม</b>	<b>๔</b>	<b>๑๘.๖๐</b>	<b>๑,๕๓๑,๐๐๐</b>	<b>๓.๓๖</b>	

**ตารางที่ ๓** สรุปการดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>			
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>			
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโคกว่าน	✓		
๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัว U ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านโคกว่าน	✓		
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสระ	✓		
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองถนน	✓		
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านสมจิต	✓		
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหมี่	✓		
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหมี่	✓		
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะครองน้อย	✓		
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโคกว่าน	✓		
๑๐. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัว U ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหมี่	✓		
๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองถนน	✓		
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร</b>			
<b>แผนงานการเกษตร</b>			
๑. โครงการฝึกอบรมเกษตรกรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน			✓
๒. โครงการอบรมเพาะชำกล้าไม้และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช			✓
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต</b>			
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>			
๑. โครงการให้ความช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ประชาชน			✓
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>			
๑. โครงการจัดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล	✓		
๒. อดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	✓		
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>			
๑. โครงการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์และวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า	✓		
<b>แผนงานการศึกษา</b>			
๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน,สื่อการเรียนการสอน ศพด.)	✓		
๒. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวัน รร.สังกัด สพฐ.)	✓		

**ตารางที่ ๓** สรุปการดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b> ๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ๒. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ๓. โครงการแข่งขันกีฬาตำบล (โคกกว่านเกมส์) ๔. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (ขึ้นเขาพนมรุ้ง)	✓ ✓ ✓ ✓		
<b>แผนงานงบกลาง</b> ๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒. เบี้ยยังชีพคนพิการ ๓. เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ๔. สมทบ สปสช.และกองทุนสวัสดิการชุมชน	✓ ✓ ✓ ✓		
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> <b>แผนงานการเกษตร</b> ๑. โครงการ "รักษ้ำป่า รักษ้ำน้ำ รักษ้ำแผ่นดิน" ๒. โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ้ำป่า (รสป)	✓		✓
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b> <b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b> ๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ๒. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ๓. อุดหนุนงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีประจำปี	✓ ✓		✓
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b> ๑. ค่าใช้จ่ายในการร้งวัดที่สาธารณะ	✓		

**ตารางที่ ๓** สรุปการดำเนินการโครงการกันเงินข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มาดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>			
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>			
๑. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโคกว่าน	✓		
๒. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมจิต	✓		
๓. โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกว่าน	✓		
๔. โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ	✓		
๕. โครงการก่อสร้างอาคารพิธีการสนามฟุตบอล	✓		
๖. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกว่าน	✓		
๗. ซ่อมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) (รถสี่ประตู)	✓		

**ตารางที่ ๓** สรุปการดำเนินการโครงการโอนงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>			
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>			
๑. โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ ม.๓ บ้านโคกสระ	✓		
๒. โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ ม.๑๐ บ้านหนองหมี่	✓		
๓. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (เส้นข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านไปคลองมะกอก)	✓		

**ตารางที่ ๓** สรุปการดำเนินการโครงการจากเงินทุนสำรองสะสม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>			
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>			
๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านโคกว่าน	√		
๒. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านโคกว่าน	√		
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสระ	√		
๔. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองถนน	√		
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านสมจิต	√		
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๖ บ้านหนองหมี	√		
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสระ	√		
๘. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๗ บ้านหนองหมี	√		
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๘ บ้านหนอง ตะครองน้อย	√		
๑๐.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัว U ม.๙ บ้านโคกว่าน	√		
๑๑.โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ม.๑๐ บ้านหนองหมี	√		
๑๒.โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ม.๑๐ บ้านหนองหมี	√		
๑๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.๑๑ บ้านหนองถนน	√		



**ตารางที่ ๔** ผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

โครงการก่อสร้างจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (จำนวน ๑๑ โครงการ)

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับจ้าง	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	ส่งมอบ งาน	สถานะ	ตัวชี้วัดและขอเสนอแนะ โครงการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑ บ้านโคกกว่าน	ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๑๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๒๕๙,๐๐๐	เส้นจากลาดยาง - ฝายละลอกโพธิ์	หจก.อุดมแทรกเตอร์	๒๕๒,๐๐๐	๒๗ เม.ย.- ๑๑ มิ.ย ๖๓ (๖๐ วัน)	๘ มิ.ย ๖๓	เบิกจ่ายแล้ว	โครงการก่อสร้างได้ตามแบบที่กำหนด/ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกขึ้น แต่ยังไม่สุดท้าย ขอให้ผู้บริหารพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการต่อไป
๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำตัว U ม.๒ บ้านโคกกว่าน	วางระบายน้ำตัว U คสล. ยาว ๑๘๕ ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ยาว ๕๒ ม. ระยะทางรวม ๒๓๗ ม.	๔๔๒,๐๐๐	เส้นกลางบ้าน ต่อจากรางเดิม - ถนนคสล.ฝั่งตะวันตก (หน้าบ้านนางสำเนียง แก้วอำไพ)	หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง	๔๓๗,๐๐๐	๒๑ ก.พ.- ๒๑ เม.ย. ๖๓ (๖๐ วัน)	๒๗ มี.ค. ๖๓	เบิกจ่ายแล้ว	ต่อจากรางระบายน้ำเดิม และก่อสร้างสุดเส้นทางแต่การระบายน้ำยังไม่ดีเท่าที่ควร สืบเนื่องจากน้ำมีปริมาณมาก และปลายทางระบายน้ำได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งผู้บริหารได้แก้ไขโดยจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๔ วางทางระบายน้ำบริเวณปลายเส้นทางซึ่งจะช่วยให้การระบายน้ำได้ดีขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับจ้าง	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	ส่งมอบ งาน	สถานะ	ตัวชี้วัดและขอเสนอแนะ โครงการ
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.๓ บ้านโคก สระ	ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๑๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร. ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๒๖๒,๐๐๐	เส้นข้างวัดโคก วาน - คลอง มะกอก	หจก.อุดม แพทรกเตอร์	๒๕๕,๐๐๐	๒๗ เม.ย.- ๑๑ มิ.ย ๖๓ (๖๐ วัน)	๘ มิ.ย ๖๓	เบิกจ่าย แล้ว	ก่อสร้างต่อจาก คสล.เดิม โครงการก่อสร้างได้ตามแบบ ที่กำหนด/ประชาชนเดินทาง สัญจรสะดวกขึ้น แต่ยังไม่สุด สาย ขอให้ผู้บริหารพิจารณา จัดสรรงบประมาณดำเนินการ ต่อไป
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๔ บ้านหนองถนน	ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๑๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม ่ น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๒๖๒,๐๐๐	ซอย ๙ - คลองมะกอก	หจก.อุดม แพทรกเตอร์	๒๕๕,๐๐๐	๕ พ.ค-๑๖ มิ.ย ๖๓ (๔๕ วัน)	๑๙ มิ.ย ๖๓	เบิกจ่าย แล้ว	ก่อสร้างต่อจาก คสล.เดิม โครงการก่อสร้างได้ตามแบบ ที่กำหนด/ประชาชนเดินทาง สัญจรสะดวกขึ้น แต่ยังไม่สุด สาย ขอให้ผู้บริหารพิจารณา จัดสรรงบประมาณดำเนินการ ต่อไป
๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้าน สมจิต ๒๕๖๕)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๔๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๑ ตร.ม. ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ ม.	๒๒๙,๐๐๐	เส้นบ้านนาย ลอย อาจเอื้อม	หจก.ปูนดี ก่อสร้าง	๒๒๙,๐๐๐	๗ พ.ค-๒๑ มิ.ย ๖๓ (๔๕ วัน)	๑๙ มิ.ย ๖๓	เบิกจ่าย แล้ว	ก่อสร้างต่อจาก คสล.เดิม และเชื่อมต่อกับเส้นหลัก โครงการก่อสร้างได้ตามแบบ ที่กำหนด/ประชาชนเดินทาง สัญจรสะดวกขึ้น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับจ้าง	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	ส่งมอบ งาน	สถานะ	ตัวชี้วัดและขอเสนอแนะ โครงการ
๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.๖ บ้าน หนองหมี่	ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร. ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๒๖๔,๐๐๐	เส้นทางพักสงฆ์ ป่าหนองหมี่	หจก.ปูนดี ก่อสร้าง	๒๖๔,๐๐๐	๗ พ.ค.-๒๑ มิ.ย ๖๓ (๔๕ วัน)	๑๙ มิ.ย ๖๓	เบิกจ่าย แล้ว	โครงการก่อสร้างได้ตามแบบ ที่กำหนด/ประชาชนเดินทาง สัญจรสะดวกขึ้น แต่ยังไม่สุด สาย ขอให้ผู้บริหารพิจารณา จัดสรรงบประมาณดำเนินการ ต่อไป
๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.๗ บ้าน หนองหมี่	ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร. ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๒๖๘,๐๐๐	เส้นทาง รพ. สต - ประปา หมู่บ้าน	บริษัท โซติ พิพัฒนาการ โยธา ๑ จำกัด	๒๔๕,๐๐๐	๑๘ มิ.ย.- ๒ ส.ค ๖๓ (๖๐ วัน)	๑๙ มิ.ย ๖๓	เบิกจ่าย แล้ว	ก่อสร้างต่อจาก คสล.เดิม โครงการก่อสร้างได้ตามแบบที่ กำหนด/ประชาชนเดินทางสัญจร สะดวกขึ้น
๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.๘ บ้าน หนองตะครองน้อย	ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร. ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๒๖๔,๐๐๐	เส้นทาง ตะวันตก หมู่บ้าน ซอย นายอัมรินทร์ อิงแอน	บริษัท เสง วานิชย์ โฮมมาร์ท จำกัด	๒๖๔,๐๐๐	๒๐ เม.ย.- ๔ มิ.ย ๖๓ (๔๕ วัน)	๒ มิ.ย ๖๓	เบิกจ่าย แล้ว	ก่อสร้างต่อจาก คสล.เดิม โครงการก่อสร้างได้ตามแบบ ที่กำหนด/ประชาชนเดินทาง สัญจรสะดวกขึ้น และ ผู้บริหารได้จัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ก่อสร้างต่อให้สุด สายและเชื่อมต่อกัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับจ้าง	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	ส่งมอบงาน	สถานะ	ตัวชี้วัดและขอเสนอแนะ โครงการ
๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.๙ บ้านโคก ว่าน	ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๑๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร. ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๒๕๙,๐๐๐	เส้นรอบนอก หมู่บ้านจาก บ้านนาง จิตกานต์ – สวนนางดวง ฤดี	บริษัท โซติ พัฒนาการ โยธา ๑ จำกัด	๒๕๓,๐๐๐	๒๗ ก.พ.- ๑๒ เม.ย.๖๓ (๔๕ วัน)	๒๔ มี.ค.๖๓	เบิกจ่าย แล้ว	โครงการก่อสร้างได้ตามแบบที่ กำหนด/ประชาชนเดินทางสัญจร สะดวกขึ้น แต่ยังไม่สุดสาย ขอให้ผู้บริหารพิจารณาจัดสรร งบประมาณดำเนินการต่อไป
๑๐	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำตัว U ม.๑๐ บ้านหนองหมี	รางระบายน้ำตัว U คสล. ยาว ๑๗๙ ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ยาว ๔๑ ม. ระยะทางรวม ๒๒๐ ม.	๔๑๒,๐๐๐	เส้นกลางบ้าน จากลาดยาง – ศาลหมี	หจก.ลูกพ่อ แดง ก่อสร้าง	๔๑๒,๐๐๐	๒๗ มี.ค.- ๒๖ พ.ค. ๖๓ (๖๐ วัน)	๑๗ เม.ย ๖๓	เบิกจ่าย แล้ว	การก่อสร้างรางระบายน้ำได้ ตามแบบที่กำหนดและ สามารถระบายน้ำได้ดี
๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.๑๑ บ้าน หนองถนน	ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร. ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ ม.	๒๒๔,๐๐๐	ซอย ๑๔	บริษัท โซติ พัฒนาการ โยธา ๑ จำกัด	๒๑๙,๐๐๐	๒๗ ก.พ.- ๑๒ เม.ย. ๖๓ (๔๕ วัน)	๒๔ มี.ค.๖๓	เบิกจ่าย แล้ว	โครงการก่อสร้างได้ตามแบบ ที่กำหนด/ประชาชนเดินทาง สัญจรสะดวกขึ้น

โครงการกันเงินปี ๖๒ มาดำเนินการปีงบประมาณ ๖๓ (จำนวน ๗ โครงการ)

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับจ้าง	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	ส่งมอบงาน	สถานะ	ตัวชี้วัดและขอเสนอแนะ โครงการ
๑	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโคกว่าน	ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ ม.	๖๒๒,๐๐๐	สายหลัก เชื่อมตำบล ละหานทราย	บริษัท บุรีรัมย์ ทรัพย์ศิริ จำกัด	๓๗๐,๐๐๐	๑๕ ม.ค.- ๑๕ มี.ค.๖๓ (๖๐ วัน)	๒๖ ก.พ.๖๓	เบิกจ่าย แล้ว	ถนนเชื่อมระหว่างตำบล ประชาชนใช้สัญจรจำนวน มาก โครงการก่อสร้างได้ตาม แบบที่กำหนด/ประชาชน เดินทางสัญจรสะดวกขึ้น
๒	โครงการก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกว่าน	สูง ๑.๕๐ ม. ยาว ๒๗.๕๐ ม.	๗๓,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านโคก ว่าน	หจก.ลูกพ่อ แดงก่อสร้าง	๗๓,๐๐๐	๑๑ ต.ค.-๒๕ พ.ย.๖๓ (๔๕ วัน)	๒๒ พ.ย. ๖๓	เบิกจ่าย แล้ว	โครงการก่อสร้างได้ตามแบบ ที่กำหนด อาคาร ศพด.เป็น สัดเป็นสวนดูสวยงาม พื้นที่ สามารถจัดการเรียนการสอน ได้ชัดเจน
๓	โครงการก่อสร้างโรง อาหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านโคกว่าน	กว้าง ๕ ม. สูง ๒.๘๐ ม. ยาว ๑๐ ม.	๒๐๓,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านโคก ว่าน	หจก.ลูกพ่อ แดงก่อสร้าง	๒๐๓,๐๐๐	๑๑ ต.ค.-๑๐ ธ.ค.๖๓ (๖๐ วัน)	๑๘ ธ.ค. ๖๓	เบิกจ่าย แล้ว	โครงการก่อสร้างได้ตามแบบ ที่กำหนด และมีพื้นที่ชัดเจน ในการบริหารจัดการ
๔	โครงการก่อสร้าง อาคารโรงจอดรถ	กว้าง ๕.๔๐ ม. สูง ๒.๘๐ ม. ยาว ๑๐ ม.	๑๐๕,๐๐๐	อบต.โคกว่าน	หจก.ลูกพ่อ แดงก่อสร้าง	๑๐๕,๐๐๐	๑๑ ต.ค.-๒๕ พ.ย.๖๓ (๔๕ วัน)	๒๒ พ.ย. ๖๓	เบิกจ่าย แล้ว	โครงการก่อสร้างได้ตามแบบ ที่กำหนด และมีพื้นที่จอดรถ เพิ่มขึ้น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับจ้าง	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	ส่งมอบงาน	สถานะ	ตัวชี้วัดและขอเสนอแนะ โครงการ
๕	โครงการก่อสร้าง อาคารพิธีการสนาม ฟุตบอล	กว้าง ๓ ม. สูง ๒.๕๐ ม.ยาว ๑๒ ม.	๑๙๓,๐๐๐	อบต.โคกवान	หจก.ลูกพ่อ แดงก่อสร้าง	๑๙๓,๐๐๐	๑๒ พ.ย.-๑๑ ม.ค.๖๓ (๖๐ วัน)	๑๐ ม.ค.๖๓	เบิกจ่าย แล้ว	โครงการก่อสร้างได้ตามแบบ ที่กำหนด และมีอาคารที่ เหมาะสมในการจัดการ แข่งขันกีฬา
๖	โครงการก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสมจิต	ขนาดรั้วสูง ๑.๕๐ ม. ยาว ๓๓ ม. ขนาดรั้ว สูง ๒ ม.ยาว ๒๕ ม.	๑๔๔,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านสมจิต	หจก.ลูกพ่อ แดงก่อสร้าง	๑๔๔,๐๐๐	๑๒ พ.ย.-๒๗ ธ.ค.๖๓ (๔๕ วัน)	๑๐ ม.ค.๖๓	เบิกจ่าย แล้ว	โครงการก่อสร้างได้ตามแบบ ที่กำหนด อาคาร ศพด.เป็น สัดส่วน,พื้นที่สามารถจัดการ เรียนการสอนได้ชัดเจน แต่ ในโอกาสต่อไปในการ ประมาณการและสำรวจพื้นที่ ก่อสร้าง ควรละเอียด รอบคอบกว่านี้ จะเห็นได้จาก กำแพงที่ยื่นออกไป ซึ่งซ้ำซ้อน กับกำแพงเดิม
๗	ซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) (รถสี่ประตู)	ขนาด ๑ ตัน ปริมาณ กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ CC หรือ กำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิล แฉับ	๘๑๔,๐๐๐	-	บริษัท มิตรชู แสงรุ่งเรือง บุรีรัมย์ จำกัด	๘๐๓,๐๐๐	๒๕ ต.ค.- ๙ ธ.ค.๖๓	๑๑ พ.ย. ๖๓	เบิกจ่าย แล้ว	รถยนต์ได้ตามมาตรฐานที่ กำหนด และช่วยให้การปฏิบัติ ราชการมีความคล่องตัวมาก ยิ่งขึ้น

โอนงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (จำนวน ๓ โครงการ)

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับจ้าง	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	ส่งมอบงาน	สถานะ	ตัวชี้วัดและขอเสนอแนะ โครงการ
๑	โครงการก่อสร้างโรง สูบน้ำ ม.๓ บ้านโคก สระ	ขนาดอาคารกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๒.๕๐ ม. สูง ๒ ม. พร้อม อุปกรณ์สูบน้ำ	๑๗๐,๐๐๐	บริเวณสระ หนองขาม (ทางเข้าวัด โคกว่าน)	หจก.ลูกพ่อ แดง ก่อสร้าง	๑๗๐,๐๐๐	๒๐ พ.ค - ๔ กค ๖๓ (๔๕ วัน)	๒๔ ม.ย.๖๓	เบิกจ่าย แล้ว	โครงการก่อสร้างได้ตามแบบ ที่กำหนด สามารถสูบน้ำได้เร็ว ขึ้นช่วยลดระยะเวลาในการ เติมน้ำได้
๒	โครงการก่อสร้างโรง สูบน้ำ ม.๑๐ บ้าน หนองหมี	ขนาดอาคารกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๒.๕๐ ม. สูง ๒ ม. พร้อม อุปกรณ์สูบน้ำ	๑๗๐,๐๐๐	บริเวณห้วย ตะกุดไทร (ติดถนนลาด ยาง)	หจก.ลูกพ่อ แดง ก่อสร้าง	๑๗๐,๐๐๐	๒๐ พ.ค - ๔ กค ๖๓ (๔๕ วัน)	๒๔ ม.ย.๖๓	เบิกจ่าย แล้ว	โครงการก่อสร้างได้ตามแบบ ที่กำหนด สามารถสูบน้ำได้เร็ว ขึ้นช่วยลดระยะเวลาในการ เติมน้ำได้
๓	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. (เส้นข้างที่ทำ การองค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกว่าน ไปคลองมะกอก)	วางท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๘๘ ม. บ่อพัก คสล. จำนวน ๑๒ บ่อ ระยะรวม ๑๐๐ ม.	๒๑๗,๐๐๐	เส้นข้างที่ทำ การองค์การ บริหารส่วน ตำบลโคกว่าน ไปคลอง มะกอก	หจก.ลูกพ่อ แดง ก่อสร้าง	๒๑๕,๐๐๐	๒๙ ส.ค - ๑๒ ต.ค.๖๓ (๔๕ วัน)	๕ ต.ค.๖๓	เบิกจ่าย แล้ว	โครงการก่อสร้างได้ตามแบบ ที่กำหนด

โครงการก่อสร้างจากเงินทุนสำรองเงินสะสม (จำนวน ๑๒ โครงการ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับจ้าง	วงเงิน ตาม สัญญา (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	ส่งมอบ งาน	สถานะ	ตัวชี้วัดและขอเสนอแนะ โครงการ
๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านโคกว่าน	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ ม.	๒๑๐,๐๐๐	เส้นศาลตา- บ้านโคกยาว	หจก.อุดม แพทรกเตอร์	๒๐๘,๐๐๐	๙ ม.ค.-๒๓ ก.พ.๖๓ (๔๕ วัน)	๖ ก.พ.๖๓	เบิกจ่าย แล้ว	โครงการก่อสร้างได้ตามแบบ ที่กำหนด/ประชาชนเดินทาง สัญจรสะดวกขึ้น การก่อสร้าง ไม่สุดแต่ผู้บริหรได้ก่อสร้าง เพิ่มเติม บรรจบกันใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒	โครงการปรับปรุง ถนนดินโดยการลง หินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านโคกว่าน	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๗๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ลงหินคลุกไม่น้อย กว่า ๓๐๐ ลบ.ม.	๑๕๓,๐๐๐	เส้นแยก ถนนหนอง เรือ-ที่นา ตาซิ่ง	หจก. นางรอง วายุพัฒน์	๑๕๓,๐๐๐	๒๖ ธ.ค.- ๙ ม.ค.๖๓ (๑๕ วัน)	๙ ม.ค.๖๓	เบิกจ่าย แล้ว	ประชาชนเดินทางสัญจรและ บรรทุกพืชผลทางการเกษตร สะดวกขึ้นโดยเฉพาะในช่วง ฤดูฝน ซึ่งปกติในช่วงนี้ถนน ลื่นเดินทางสัญจรลำบากมาก
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้าน โคกสระ	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๔ ตร.ม. ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ ม.	๒๑๙,๐๐๐	เส้นบ้านยาย สวาท-ถนน รอบนอก หมู่บ้าน	หจก.อุดม แพทรกเตอร์	๒๑๙,๐๐๐	๙ ม.ค.- ๘ ก.พ.๖๓ (๓๐ วัน)	๗ ก.พ.๖๓	เบิกจ่าย แล้ว	โครงการก่อสร้างได้ตามแบบ ที่กำหนด/ประชาชนเดินทาง สัญจรสะดวกขึ้น



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับจ้าง	วงเงิน ตาม สัญญา (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	ส่งมอบ งาน	สถานะ	ตัวชี้วัดและขอเสนอแนะ โครงการ
๔	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองถนน	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. ปริมาณงานไม่น้อย กว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. (เกรดบดอัด)	๑๑๑,๐๐๐	เส้นหนอง แพทย์ศาสตร์ หนองถนน - ละหานทราย	หจก. นางรอง วายุพัฒน์	๑๑๑,๐๐๐	๒๖ ธ.ค.- ๙ ม.ค.๖๓ (๑๕ วัน)	๙ ม.ค.๖๓	เบิกจ่าย แล้ว	ถนนเส้นนี้เชื่อมต่อระหว่างตำบล ระยะทางหลายกิโลเมตร ประชาชนเดินทางสัญจร จำนวนมาก การปรับปรุง ถนนหินคลุกช่วยให้การ เดินทางสะดวกขึ้น
๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้าน สมจิต	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตร.ม.	๒๐๙,๐๐๐	เส้นขนาน คลองส่งน้ำ ทิศเหนือ	บริษัท โซติ พิพัฒนการ โยธา ๑ จำกัด	๒๐๙,๐๐๐	๙ ม.ค.- ๘ ก.พ.๖๓ (๓๐ วัน)	๔ ก.พ.๖๓	เบิกจ่าย แล้ว	โครงการก่อสร้างได้ตามแบบ ที่กำหนด/ประชาชนเดินทาง สัญจรสะดวกขึ้น
๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.๖ บ้าน หนองหมี่	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม. ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ ม.	๒๒๓,๐๐๐	เส้นข้าง โรงเรียน บ้านหนอง หมี่ทางทิศ ตะวันตก	บริษัท โซติ พิพัฒนการ โยธา ๑ จำกัด	๒๒๓,๐๐๐	๙ ม.ค.- ๘ ก.พ.๖๓ (๓๐ วัน)	๔ ก.พ.๖๓	เบิกจ่าย แล้ว	โครงการก่อสร้างได้ตามแบบ ที่กำหนด/ประชาชนเดินทาง สัญจรสะดวกขึ้น
๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.๗ บ้าน หนองหมี่	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๑๕.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๗.๕๐ ตร.ม. ไหล่ ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๓๐๓,๐๐๐	เส้นข้าง รพ. สต.-ประปา หมู่บ้าน	หจก.ปูนดี ก่อสร้าง	๓๐๐,๐๐๐	๒๕ ธ.ค.- ๘ ก.พ.๖๓ (๔๕ วัน)	๓๐ ม.ค.๖๓	เบิกจ่าย แล้ว	ต่อจาก คสล.เดิม โครงการ ก่อสร้างได้ตามแบบที่กำหนด/ ประชาชนเดินทางสัญจร สะดวกขึ้นแต่ยังไม่สุดสาย ขอให้ผู้บริหารพิจารณาจัดสรร งบประมาณดำเนินการต่อไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับจ้าง	วงเงิน ตาม สัญญา (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	ส่งมอบ งาน	สถานะ	ตัวชี้วัดและขอเสนอแนะ โครงการ
๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.๘ บ้าน หนองตะครองน้อย	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ ม.	๒๐๖,๐๐๐	ทิศตะวันออก จากลาดยาง - บ้านนาย เชษฐ ชินรัมย์	หจก.อุดม แทรกเตอร์	๒๐๖,๐๐๐	๙ ม.ค.- ๘ ก.พ.๖๓ (๓๐ วัน)	๗ ก.พ.๖๓	เบิกจ่าย แล้ว	โครงการก่อสร้างได้ตามแบบ ที่กำหนด/ประชาชนเดินทาง สัญจรสะดวกขึ้น แต่ยังไม่สุด สาย ขอให้ผู้บริหารพิจารณา จัดสรรงบประมาณดำเนินการ ต่อไป
๙	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำตัว U ม.๙ บ้านโคกवान	วางระบายน้ำตัว U คสล.ระยะทาง ๒๑๔ ม.	๔๐๒,๐๐๐	จากบ้านนาย นนท์ สังขระ - ศาลตา	หจก.ลูกฟ่อ แดง ก่อสร้าง	๔๐๒,๐๐๐	๒๖ ธ.ค.- ๒๔ ก.พ.๖๓ (๔๕ วัน)	๑๔ ก.พ.๖๓	เบิกจ่าย แล้ว	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบที่ กำหนด ช่วยระบายน้ำบริเวณ ดังกล่าวได้ดี
๑๐	โครงการปรับปรุง ถนนดินโดยการลง หินคลุก ม.๑๐ บ้าน หนองหมี่	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๙๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๘ ตร.ม. ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ ม.	๑๑๒,๐๐๐	จากแยก ถนนลาดยาง โคกสะอาด - หนองหมี่ ถึง ที่นายนายลบ คงคำว	หจก.ภู-ภา ละทาน ทราย	๑๑๒,๐๐๐	๒๗ ธ.ค.- ๑๐ ม.ค. ๖๓ (๑๕ วัน)	๓ ม.ค.๖๓	เบิกจ่าย แล้ว	ถนนเส้นนี้ประชาชนใช้ในการ บรรทุกพืชผลทางการเกษตร การปรับปรุงถนนดินโดยการ ลงหินคลุกช่วยให้การเดินทาง สะดวกขึ้น
๑๑	โครงการปรับปรุง ถนนดินโดยการลง หินคลุก ม.๑๐ บ้าน หนองหมี่	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๙๖ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๘ ลบ.ม. ดินถมไม่ น้อยกว่า ๑๓๕ ลบ.ม.	๘๔,๐๐๐	เส้นข้างวัด หนองหมี่	หจก.ภู-ภา ละทาน ทราย	๘๔,๐๐๐	๒๗ ธ.ค.- ๑๐ ม.ค. ๖๓ (๑๕ วัน)	๓ ม.ค.๖๓	เบิกจ่าย แล้ว	การเดินทางสัญจรสะดวก ยิ่งขึ้น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับจ้าง	วงเงิน ตาม สัญญา (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	ส่งมอบ งาน	สถานะ	ตัวชี้วัดและขอเสนอแนะ โครงการ
๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต ม.๑๑ บ้านหนองถนน	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๙๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๘ ตร.ม. ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ ม.	๑๙๗,๐๐๐	เส้นข้างวัด หนองถนน	บริษัท โซติ พิพัฒนการ โยธา ๑ จำกัด	๑๙๗,๐๐๐	๙ ม.ค.- ๘ ก.พ.๖๓ (๓๐ วัน)	๔ ก.พ.๖๓	เบิกจ่าย แล้ว	ปกติถนนเส้นนี้จะต้อง ปรับปรุงเป็นประจำทุกปี การ ก่อสร้างถนน คสล. ช่วย แก้ปัญหานี้และประชาชน เดินทางสะดวกขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรม เกษตรกรอินทรีย์และ เกษตรผสมผสาน	อบรมให้ความรู้ ให้กับ กลุ่มเป้าหมายให้ เข้าใจเกี่ยวกับ เกษตรกรอินทรีย์ และเกษตร ผสมผสาน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการอบรม เพาะชำกล้าไม้และ อนุรักษ์พันธุกรรม พืช	อบรมให้ความรู้ ให้กับ กลุ่มเป้าหมายให้ เข้าใจเกี่ยวกับ การเพาะชำกล้า ไม้และอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	๒๐,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	โครงการให้ความ ช่วยเหลือหรือ สงเคราะห์ ประชาชน	ให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตาม ระเบียบกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด	-	ไม่ได้ดำเนินการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	โครงการจุดบริการ ประชาชนในช่วง เทศกาล	ให้บริการและเฝ้า ระวังและอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนที่ เดินทางสัญจร ในช่วงเทศกาลปี ใหม่และ สงกรานต์	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	ม.ค.๖๓/ เม.ย.๖๓	สำนักปลัด	อำนวยความสะดวกและ บริการประชาชนในการ เดินทางสัญจรในช่วง เทศกาล	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๒	อุดหนุนเหล่า กาชาดจังหวัด บุรีรัมย์	อุดหนุนเงินให้กับ เหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินกิจกรรม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๓	สำนักปลัด	เหล่ากาชาดจังหวัดนำ เงินไปดำเนินการ สังเคราะห์ให้กับผู้ยากไร้	

#### แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	โครงการฉีดวัคซีน ป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อใน สัตว์และวัคซีนโรค พิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าใน เขตพื้นที่ตำบล โคกवान	๖๐,๐๐๐	๕๘,๕๖๐	๑,๔๔๐	เม.ย.-พ.ค. ๖๓	สำนักปลัด	สุนัขที่ขึ้นทะเบียนได้รับ การฉีดวัคซีน ช่วยให้ ชุมชนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน,สื่อ การเรียนการสอน ศพด.)	อุดหนุนเงิน ค่าอาหารกลางวัน ,สื่อการเรียนการ สอน ศพด.	๕๖๖,๔๒๒	๕๕๒,๕๐๐	๑๓,๙๒๒	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	กอง การศึกษา	อุดหนุนอาหารกลางวัน และสื่อการเรียนการสอน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ ครบตามจำนวนเด็ก	
๒	เงินอุดหนุนส่วน ราชการ (อาหาร กลางวัน รร.สังกัด สพฐ.)	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้กับ รร. สังกัด สพฐ. จำนวน ๔ โรง	๑,๙๔๘,๐๐๐	๑,๙๔๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	กอง การศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับ รร.สังกัด สพฐ.ครบ ตามจำนวน	

แผนงานการศึกษาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายในการ จัดส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬา ต่าง ๆ	ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา	๕๐,๐๐๐	๔๖,๗๕๗	๓,๒๔๓	ม.ค.๖๓	กอง การศึกษา	พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิก ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม สานความรักความสามัคคี ในองค์กรและชุมชน	
๒	โครงการสืบสาน ประเพณีลอย กระทง	จัดกิจกรรมโดย อบต.เป็น ศูนย์กลางในการ สืบสานประเพณี ลอยกระทงให้ ประชาชนมาร่วม กิจกรรม	๒๕,๐๐๐	๒๔,๒๗๕	๗๒๕	พ.ย.๖๓	กอง การศึกษา	ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม และสามารถสืบสาน ประเพณีท้องถิ่นสืบต่อไป	
๓	โครงการแข่งขัน กีฬาตำบล (โคก वानเกมส์)	จัดการแข่งขัน กีฬาให้ชุมชนได้ เข้ามามีส่วนร่วม และเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาเพื่อ ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของ ชุมชน	๑๕๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	มี.ค.๖๓	กอง การศึกษา	เด็ก เยาวชน และ ประชาชนเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา ช่วยให้ชุมชน มีความรัก ความสามัคคีใน หมู่คณะ	



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๔	เงินอุดหนุนส่วน ราชการ (ขึ้นเขาพนมรุ้ง)	อุดหนุนจังหวัด บุรีรัมย์ ในการจัดประเพณี ขึ้นเขาพนมรุ้ง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	มี.ค.๖๓	กอง การศึกษา	อุดหนุนจังหวัดบุรีรัมย์ใน การจัดกิจกรรมประเพณี ขึ้นเขาพนมรุ้ง ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	

#### แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยให้กับ ผู้สูงอายุที่ขึ้น ทะเบียนทุกเดือน	๘,๗๘๖,๔๐๐	๗,๕๗๙,๕๐๐	๑,๒๐๖,๙๐๐	ต.ค.๖๑-ก.ย. ๖๓	กอง สวัสดิการ สังคม	ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียน ได้รับเบี้ยทุกคน	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเบี้ยให้กับผู้ พิการที่ขึ้น ทะเบียนทุกเดือน	๕,๒๘๐,๐๐๐	๔,๐๒๒,๒๐๐	๑,๒๕๗,๘๐๐	ต.ค.๖๑-ก.ย. ๖๓	กอง สวัสดิการ สังคม	ผู้พิการที่มีคุณสมบัติครบ ได้รับเบี้ยทุกคน	
๓	เบี้ยผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยผู้ป่วย เอดส์ที่แสดงตน	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๔,๕๐๐	๔๕,๕๐๐	ต.ค.๖๑-ก.ย. ๖๓	กอง สวัสดิการ สังคม	ผู้ป่วยเอดส์ที่แสดง เจตจำนงได้รับเบี้ยทุกคน	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๔	สมทบ สปสช.และ กองทุนสวัสดิการ ชุมชน	สมทบ สปสช. และกองทุน สวัสดิการชุมชน ตามระเบียบ กำหนด	๑๘๐,๐๐๐	๑๕๒,๕๐๐	๒๗,๕๐๐	ม.ค.๖๒/ส.ค. ๖๓	สำนัก ปลัด/กอง สวัสดิการ สังคม	กองทุน สปสช.และ กองทุนสวัสดิการชุมชน ได้รับเงินและดำเนิน กิจกรรมตามระเบียบ ปฏิบัติ	

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**แผนงานการเกษตร**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	โครงการ "รักษ์ป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน"	ดำเนินโครงการ" รักษ์ป่า รักน้ำ รัก แผ่นดิน" ในเขต พื้นที่	๒๐,๐๐๐	๑๒,๒๕๐	๗๗๕๐	ส.ค.๖๓	สำนักปลัด	ประชาชนในชุมชนเข้าร่วม กิจกรรมและร่วมปลูก ต้นไม้ ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าได้	
๒	โครงการฝึกอบรม ราษฎรอาสาสมัคร พิทักษ์ป่า (รสทป.)	ดำเนินโครงการ โครงการฝึกอบรม ราษฎร อาสาสมัครพิทักษ์ ป่า (รสทป.)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายในการ จัดการเลือกตั้ง	ค่าใช้จ่ายในการ จัดการเลือกตั้ง ท้องถิ่นตาม ระเบียบ กฎหมาย	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน	อบรมเพิ่มพูน ความรู้และทัศน ศึกษาดูงานให้แก่ พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิก ผู้นำนำ หมู่บ้าน	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๕,๖๐๐	๑๔,๔๐๐	มี.ค.๖๓	สำนักปลัด	พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิก ผู้นำหมู่บ้าน เข้าร่วมรับ การอบรม เสริมสร้างความ รักความสามัคคีต่อกัน	
๔	อุดหนุนงานพระ ราชพิธีและงานรัฐ พิธีประจำปี	อุดหนุนงานพระ ราชพิธีและงานรัฐ พิธีให้กับที่ทำการ เทศบาลตำบล ละหานทราย ดำเนินกิจกรรม	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	ต.ค.๖๓	สำนักปลัด	ส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมพระราช พิธีและงานรัฐพิธี	

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายในการ รังวัดที่สาธารณะ	รังวัดที่สาธารณะใน เขตตำบลโคกกว่าน	๒๐๐,๐๐๐	๗,๕๗๕	๑๘๐,๔๒๕	-	กองช่าง	สามารถยืนยันแนวเขตที่ สาธารณะได้ชัดเจน	

**ตารางที่ ๕** สรุปผลความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓


ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด (ปี ๖๓)		โครงการที่จัด ตั้งงบประมาณ		โครงการ ที่ดำเนินการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐๘	๕๑.๙๒	๓๓	๓๐.๕๖	๓๓	๓๐.๕๖
๒. การพัฒนาด้านการเกษตร	๑๒	๕.๗๗	๒	๑๖.๖๗	๐	๐
๓. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๕๑	๒๔.๕๒	๑๔	๒๗.๔๕	๑๔	๒๗.๔๕
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๒	๑๐.๕๘	๒	๙๐.๙	๑	๔.๕๕
๕. ด้านการบริหารจัดการจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๕	๗.๒๑	๔	๒๖.๖๗	๓	๒๐.๐๐
รวม	๒๐๘	๑๐๐	๕๕	๒๖.๔๔	๕๑	๒๔.๕๒

ร้อยละของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.๒๕๖๓ มาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และโครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม/โอนเงิน คิดเป็น  $(๕๕ \times ๑๐๐) / ๒๐๘ = ๒๖.๔๔$

โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งสิ้นที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  $(๕๑ \times ๑๐๐) / ๕๕ = ๙๒.๗๒$

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๘ โครงการ  
ตั้งงบประมาณไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และโครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม/  
โอนเงินดำเนินการ จำนวน ๕๕ โครงการ  
โครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๕๑ โครงการ

**แผนภูมิ** แสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

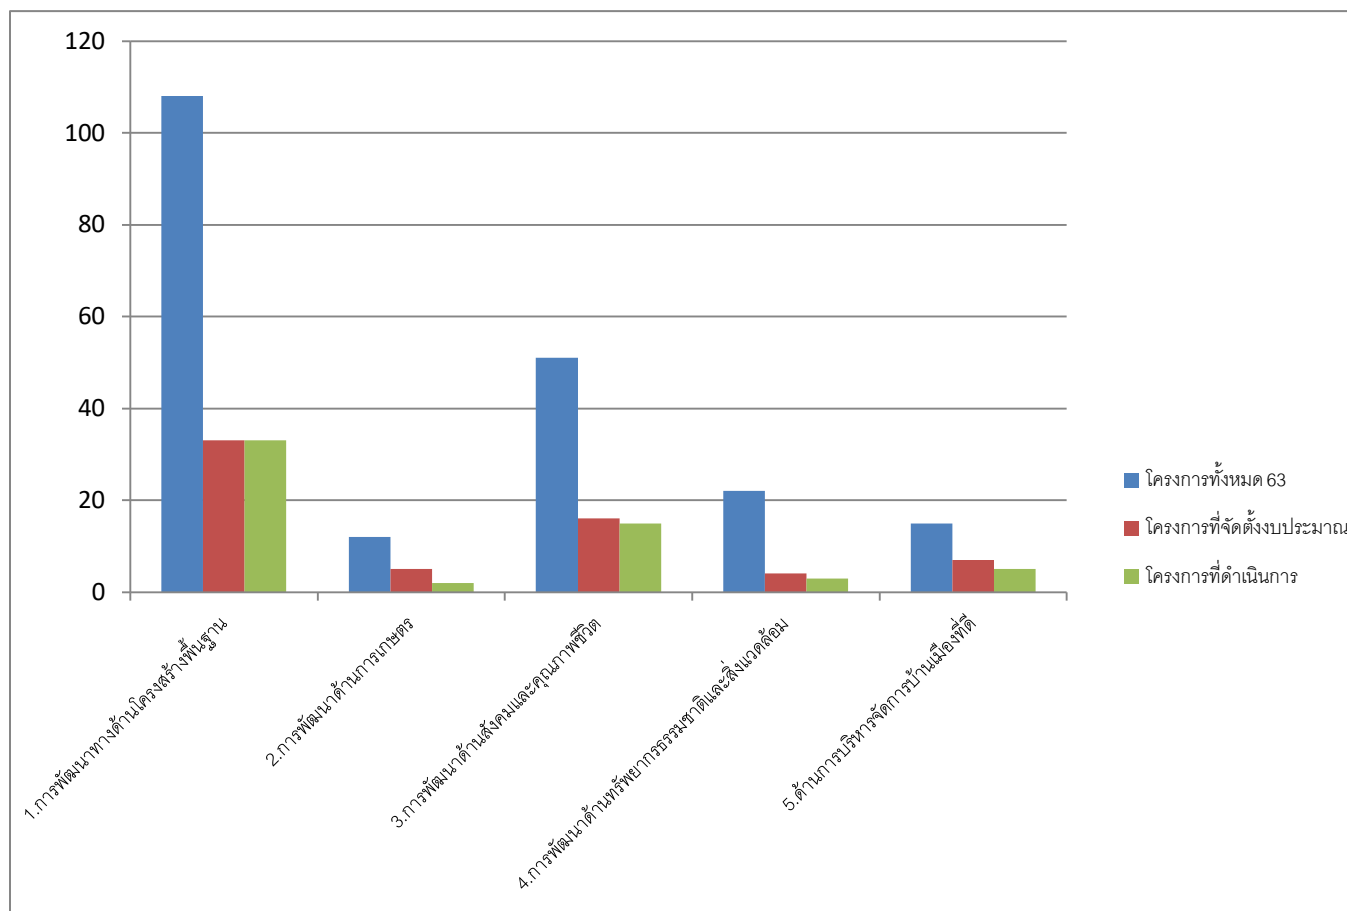

**ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานในภาพรวม**

๑. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่านจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ

๒. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย

๓. โครงการกิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากการใช้จ่ายเงินอาจไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่กำหนด

**หมายเหตุ :** ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจำกัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่านประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง คือภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจำ ภาระงานที่ได้รับการถ่ายโอนแต่ไม่มีงบประมาณมาให้ ในขณะที่รายได้ที่ได้รับจากการจัดสรรและเงินอุดหนุนมีอย่างจำกัด

### มีข้อเสนอแนะ

๑. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป

๒. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๓ นอกจากเสนอสภา ฯ รับทราบและ ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้วจะต้องมีการแจกให้กองต่างๆ รับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวม เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นต่อไป

๓. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการ ไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการและงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้การ ดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

๔. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องสำคัญ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้ดำเนินการเกี่ยวกับ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อยไม่เป็นรูปธรรม

**แบบที่ ๓** แบบประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

**แบบที่ ๓/๑** แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**ส่วนที่ ๑** ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน

๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

**ส่วนที่ ๒** ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีที่ประเมิน

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐๘	๓๓	๓๐.๕๖
๒. การพัฒนาด้านการเกษตร	๑๒	๒	๑๖.๖๗
๓. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๕๑	๑๕	๒๙.๔๑
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๒	๓	๑๓.๖๔
๕. ด้านการบริหารจัดการจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๕	๕	๓๓.๓๓
<b>รวม</b>	<b>๒๐๘</b>	<b>๕๘</b>	<b>๒๗.๘๘</b>

**ส่วนที่ ๓** ผลการดำเนินงาน (ผลการสำรวจจากแบบที่ ๓/๒)

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก (คน)	ร้อยละ	พอใจ (คน)	ร้อยละ	ไม่พอใจ (คน)	ร้อยละ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๒	๒๙.๐๙	๗๐	๖๓.๖๔	๘	๗.๒๗
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๒๐	๑๘.๑๘	๘๐	๗๒.๗๓	๑๐	๙.๐๙
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๒	๒๐.๐๐	๘๕	๗๗.๒๗	๓	๒.๗๓
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๒๕	๒๒.๗๓	๘๕	๗๗.๒๗	๐	๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๙.๐๙	๗๕	๖๘.๑๘	๒๕	๒๒.๗๓
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๘	๒๕.๕๕	๗๒	๖๕.๕๕	๑๐	๙.๐๙
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๕๐	๔๕.๕๕	๖๐	๕๕.๕๕	๐	๐
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๓๘	๓๕.๕๕	๗๒	๖๕.๕๕	๐	๐
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๒	๓๘.๑๘	๖๘	๖๑.๘๒	๐	๐
<b>ภาพรวมเฉลี่ย</b>	<b>๒๙.๖๗</b>	<b>๒๖.๘๘</b>	<b>๗๔.๑๑</b>	<b>๖๗.๓๗</b>	<b>๖.๒๒</b>	<b>๕.๖๕</b>

จากการสุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน จำนวน ๑๑๐ คน ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่านในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๘ มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๓๗ และไม่พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๕



**แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกवानในภาพรวม**

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกवानในภาพรวมโดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูล ประเมินประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. เพศ           (✓) ชาย ๖๘ คน                                   (✓) หญิง ๔๒ คน
๒. อายุ           ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี.....คน                           (✓) ๒๐-๓๐ ปี ๒๘ คน                           (✓) ๓๑-๔๐ ปี ๓๒ คน  
                      (✓) ๔๑-๕๐ ปี ๑๙ คน                           (✓) ๕๑-๖๐ ปี ๒๐ คน                           (✓) มากกว่า ๖๐ ปี ๑๑ คน
๓. การศึกษา   (✓) ประถมศึกษา ๓๕ คน                           (✓) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๔๐ คน  
                      ( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า.....คน  
                      (✓) ปริญญาตรี ๑๐ คน                           ( ) สูงกว่าปริญญาตรี.....คน                   (✓) อื่น ๆ ๒๕ คน
๔. อาชีพหลัก   ( ) รับราชการ.....คน                           ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.....คน  
                      ( ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว.....คน  
                      (✓) รับจ้าง ๑๘ คน                           (✓) นักเรียนนักศึกษา ๕ คน                   (✓) เกษตรกร ๖๘ คน  
                      (✓) อื่น ๆ (ระบุ) ๑๙ คน

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกवानในภาพรวม**

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกवानในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจ	พอใจมาก (คน)	พอใจ (คน)	ไม่พอใจ (คน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๒	๗๐	๘
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๒๐	๘๐	๑๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๒	๘๕	๓
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๒๕	๘๕	๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๗๕	๒๕
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๘	๗๒	๑๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๕๐	๖๐	๐
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๓๘	๗๒	๐
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๒	๖๘	๐
<b>ภาพรวมเฉลี่ย</b>	<b>๒๙.๖๗</b>	<b>๗๔.๑๑</b>	<b>๖.๒๒</b>

จากการสุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान จำนวน ๑๑๐ คน ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกवानในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจมาก จำนวนเฉลี่ย ๒๙.๖๗ คน มีความพึงพอใจ จำนวนเฉลี่ย ๗๔.๑๑ คน และไม่พึงพอใจ จำนวนเฉลี่ย ๖.๒๒ คน

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान ในแต่ละยุทธศาสตร์

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑๑. เพศ (✓) ชาย ๖๘ คน (✓) หญิง ๔๒ คน
๒. อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี.....คน (✓) ๒๐-๓๐ ปี ๒๘ คน (✓) ๓๑-๔๐ ปี ๓๒ คน  
 (✓) ๔๑-๕๐ ปี ๑๙ คน (✓) ๕๑-๖๐ ปี ๒๐ คน (✓) มากกว่า ๖๐ ปี ๑๑ คน
๓. การศึกษา (✓) ประถมศึกษา ๓๕ คน (✓) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๔๐ คน  
 ( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า.....คน  
 (✓) ปริญญาตรี ๑๐ คน ( ) สูงกว่าปริญญาตรี.....คน (✓) อื่น ๆ ๒๕ คน
๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ.....คน ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.....คน  
 ( ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว.....คน  
 (✓) รับจ้าง ๑๘ คน (✓) นักเรียนนักศึกษา ๕ คน (✓) เกษตรกร ๖๘ คน  
 (✓) อื่น ๆ (ระบุ) ๑๙ คน

**ยุทธศาสตร์ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๖.๗๗
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๘
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๒๕
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖.๒๘
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๑๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	๗.๘๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
<b>ภาพรวมเฉลี่ย</b>	<b>๗.๖๑</b>

จากการสุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान จำนวน ๑๑๐ คน ความพึงพอใจของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๗.๖๑ คะแนน

### ยุทธศาสตร์ ๒. การพัฒนาด้านการเกษตร

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
<b>ภาพรวมเฉลี่ย</b>	

จากการสุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน จำนวน ..... คน ความพึงพอใจของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านการเกษตร ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ..... คะแนน

หมายเหตุ : .ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านการเกษตร ไม่ได้ดำเนินโครงการ จึงไม่สามารถประเมินได้

### ยุทธศาสตร์ ๓. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๖
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๑
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๖.๕๔
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๓๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๒๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖.๒๓
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	๖.๑๔
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๕
<b>ภาพรวมเฉลี่ย</b>	<b>๖.๒๐</b>

จากการสุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน จำนวน ๑๑๐ คน ความพึงพอใจของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๖.๒๐ คะแนน

ยุทธศาสตร์ ๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๖
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๖.๒๕
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๕.๒๔
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๖.๖๕
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๒๕
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๕.๒๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	๖.๔๒
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖.๕๔
<b>ภาพรวมเฉลี่ย</b>	<b>๖.๔๐</b>

จากการสุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน จำนวน ๑๑๐ คน ความพึงพอใจของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๖.๔๐ คะแนน

ยุทธศาสตร์ ๕. ด้านการบริหารจัดการจัดการบ้านเมืองที่ดี

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๖
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๖.๒๕
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๒๔
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๖.๓๕
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖.๘๕
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๒๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	๖.๔๒
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖.๕๔
<b>ภาพรวมเฉลี่ย</b>	<b>๖.๘๐</b>

จากการสุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน จำนวน ๑๑๐ คน ความพึงพอใจของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ๕. ด้านการบริหารจัดการจัดการบ้านเมืองที่ดี ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๖.๘๐ คะแนน

ภาคผนวก

**แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกवानในภาพรวม**

**คำชี้แจง :** แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในภาพรวมโดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

- ๑. เพศ                   ( ) ชาย   ( ) หญิง
- ๒. อายุ                 ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี   ( ) ๒๐-๓๐ ปี   ( ) ๓๑-๔๐ ปี  
                              ( ) ๔๑-๕๐ ปี   ( ) ๕๑-๖๐ ปี   ( ) มากกว่า ๖๐ ปี
- ๓. การศึกษา           ( ) ประถมศึกษา   ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  
                              ( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า                       ( ) ปริญญาตรี                                       ( ) สูงกว่าปริญญาตรี  
                              ( ) อื่น ๆ .....
- ๔. อาชีพหลัก           ( ) รับราชการ   ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ                                       ( ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  
                              ( ) รับจ้าง   ( ) นักเรียนนักศึกษา                                       ( ) เกษตรกร  
                              ( ) อื่น ๆ (ระบุ).....

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกवानในภาพรวม**

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกवानในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจ	พอใจมาก (คน)	พอใจ (คน)	ไม่พอใจ (คน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
<b>ภาพรวมเฉลี่ย</b>			

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान  
ในแต่ละยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
๒. อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี ( ) ๒๐-๓๐ ปี ( ) ๓๑-๔๐ ปี  
( ) ๔๑-๕๐ ปี ( ) ๕๑-๖๐ ปี ( ) มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  
( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี  
( ) อื่น ๆ .....
๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  
( ) รับจ้าง ( ) นักเรียนนักศึกษา ( ) เกษตรกร  
( ) อื่น ๆ (ระบุ).....

ยุทธศาสตร์ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ยุทธศาสตร์ ๒. การพัฒนาด้านการเกษตร

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

**ยุทธศาสตร์ ๓. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต**

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

**ยุทธศาสตร์ ๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

**ยุทธศาสตร์ ๕. ด้านการบริหารจัดการจัดการบ้านเมืองที่ดี**

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	



